ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

ವಿಷಯ Providing and Illumination of decorative Tusker ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ -1-

Street lights Poles and lights from Tirumala ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ BBMP/EE/BE/YNK/PR/23-24/

to MS Palya circle in ward No 03

ಕಂಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು
(1)	ಕೆಲಸದ ಹೆಸರು:- **Providing and Illumination of decorative Tusker street lights poles and lights from Tirumala dhaba to M.S.Palya circle in ward no 03.** *****
(2)	ಮೇಲ್ಕಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಜಾಬ್ ಕೋಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ: 003-22-000030 ರಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಕೇತ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ನಂತರ ಇ-ಪ್ರಕ್ಯೂರ್‌ಮೆಂಟ್ ಟೆಂಡರ್ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ವಲಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ-03 ರಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು **ಮೆ:ಸುರಕ್ಷ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ಸ್** ರವರಿಗೆ ಕಾರ್ಯದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ:EE (Project)/YNK Zone/WO/000045/22-23, Dt:15.10.2022 ರಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ವಹಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅದರಂತೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದು, ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲಿನ ಮೊತ್ತ ರೂ.2,40,70,495/- ಗಳಿಗೆ ತಯಾರಿಸಿದ್ದು, ಅಳತೆಗಳನ್ನು ಅಳತೆ ಪುಸ್ತಕ 2606/23-24 ಪುಟ 260501 ರಿಂದ 260510 ರಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿ ಕಾಮಗಾರಿಯಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿದ ಪರಿಕರಗಳ ಕಂಪನಿಯಿಂದ ಪಡೆದ Test Reports, PMC ರವರಿಂದ ಪಡೆದ Test Reports EMB, Bill Copy ಹಾಗೂ GPS ಫೋಟೊದೊಂದಿಗೆ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಅಂತಿಮ ಪರಿಶೀಲನಾ ವರದಿಯನ್ನು ಕೋರಿ ಕಡತವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ. ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ವಿದ್ಯುತ್) ಯಲಹಂಕ ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ 4-11-23
(3)	ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ಗು.ನಿ)

ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರವರ ಕಛೇರಿ
ಬಾಂಧವ್ಯಗಣಕಿಯಂತ್ರದಲ್ಲಿ
ಸಂಖ್ಯೆ 1207
ದಿನಾಂಕ 7/11/23
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

15/11

ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರವರ ಕಛೇರಿ
ಗುಣನಿಯಂತ್ರಣಾಧಿಕಾರಿ
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

15/11

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

ವಿಷಯ Tuskar street lights from Tirumala ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ -2-

Daba to M.S.Palya circle in ward no 03 ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ CE/EE/GR/1207/2324

ಕಂಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

ವಿಷಯ:- Providing and Installation of Decorative Tuskar street lights from Tirumala Daba to M.S.Palya Circle in ward no 03.ರ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಗುಣಭರವಸೆ ವಿಭಾಗದ ವತಿಯಿಂದ ಕೈಗೊಂಡ ತಪಾಸಣಾ ವರದಿ.

ಉಲ್ಲೇಖ:-
1. ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಆಯುಕ್ತರು ರವರ ಕಛೇರಿ ಆದೇಶದ ಸಂಖ್ಯೆ:ಮು.ಆ/ಪಿಎಸ್ಆರ್(ಜಿ)/1646/2022-23, ದಿ: 01.08.2022.
2. ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಆಯುಕ್ತರು ರವರ ಕಛೇರಿ ಆದೇಶದ ಸಂಖ್ಯೆ:ಮು.ಆ /ಪಿಎಸ್ಆರ್(ಜಿ)/2383/2022-23, ದಿ: 14.09.2022
3. ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ಗುಣಭರವಸೆ) ವಿಭಾಗ ರವರ ಆದೇಶದ ಸಂಖ್ಯೆ: ಮು.ಆ/ಗುಣಭರವಸೆ/ಪಿಆರ್/32/2022-23 ದಿನಾಂಕ: 06.09.2022.

****

ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿಷಯ ಹಾಗೂ ಉಲ್ಲೇಖಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಪಶ್ಚಿಮ ವಲಯದ, ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀಪುರಂ ವಿಭಾಗದ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು Providing and Installation of Decorative Tuskar street lights from Tirumala Daba to M.S.Palya Circle in ward no 03.. Estimate Cost: 250.00 lakhs, Job Number: 003-22-000030 (1st & Final Bill) ರ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ Quality Assurance ಪಡೆಯಲು ಕೋರಿ ಕಡತವನ್ನು ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ಯಲಹಂಕ) ವಿಭಾಗದವರು ದಿನಾಂಕ: 07-11-2023 ರಂದು ಈ ಕಛೇರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. 04

ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿರುವ, ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಹಾಗೂ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ, ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ವಿದ್ಯುತ್-ಯಲಹಂಕ) ಯೋಜನಾ ಸಮಾಲೋಚಕರು ಹಾಗೂ ಕಿರಿಯ ಅಭಿಯಂತರರು ಗುಣಭರವಸೆ ವಿಭಾಗದವರೊಂದಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವ/ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಆಯುಕ್ತರು ರವರ ಕಛೇರಿ ಆದೇಶದ ಸಂಖ್ಯೆ:ಮು.ಆ/ಪಿಎಸ್ಆರ್(ಜಿ)/1646/2022-23, ದಿ:01.08.2022. ರಂತೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು **ಅಯ್ದ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ** ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿರುವ ವಿವರಗಳನ್ನು ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿರುತ್ತದೆ. 05

1. Thirumala Dabha junction, M S Palya main Road ದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿರುವ Tuskar Pole and 150 W Street light ಗೆ Physical Inspection ಅನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಯಿತು.
2. Opposite to Green Pine, M S Palya main Road. ದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿರುವ Tuskar Pole and 150 W Street light ಗೆ Physical Inspection ಅನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಯಿತು.
3. Opposite to Royal Enfield, M S Palya main Road ದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿರುವ Tuskar Pole and 150 W Street light ಗೆ Physical Inspection ಅನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಯಿತು.
4. Opposite to Adhi Shakthi Chowdeshwari Temple, M S Palya main Road ದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿರುವ Tuskar Pole and 150 W Street light. ಗೆ Physical Inspection ಅನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಯಿತು.

ಪುಟ ನೋಡಿ

ವಿಷಯ : Tuskar street lights from Thirumala Dabar to M.S Palya circle in W.no 03.

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ CE(GP)/GL/1207/23-24

ಕಂಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

5. Opposite to Sumuk Square, M S Palya main Road. ದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿರುವ Tuskar Pole and 150 W Street light ಗೆ Physical Inspection ಅನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಯಿತು.
6. No 284 A, AMS Layout, Vidyaranyapura ದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿರುವ 7.5 Mtrs Tubular Pole and 90 W Street light ಅನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಯಿತು.
7. Saravana Nilaya, 1st Main, 3rd Cross, Thirumala Nagar. ದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿರುವ 90 Watts Street lights ಗೆ Physical Inspection ಅನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಯಿತು.
8. Opposite to SR Glass and ply wood Thirumala Nagar, 1st Main, 4th Cross, ದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿರುವ Timer ಗೆ Physical Inspection ಅನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಯಿತು.
9. GE/03/TC/01/14/MR/04/S, 1st Main, SFS 4TH phase Yelahanka New town ದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿರುವ 90 Watts Street lights ಗೆ Physical Inspection ಅನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಯಿತು.

06) ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಆಯುಕ್ತರುರವರ ಕಛೇರಿ ಆದೇಶಗಳನ್ವಯ ಅನುಷ್ಠಾನ ಅಭಿಯಂತರರು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುವ/ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುವ ಕಾಮಗಾರಿ ಅಂಶಗಳ ಪರಿಮಾಣ, ಅಳತೆ ಹಾಗೂ ಗುಣಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಘಟಕದ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣ ಜವಾಬ್ದಾರರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಾ ಮತ್ತು ನಿರ್ಮಾಣ ಘಟಕದ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ರವರು ಉಲ್ಲೇಖ (1) ರ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯಲ್ಲಿ ಸಮೂದಿಸಿರುವಂತೆ ಸಮಯೋಚಿತವಾಗಿ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಸಾಮಾಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ, ಸ್ಥಾಪಿತ ನಿರ್ಮಾಣ ಪದ್ಧತಿಗಳಂತೆ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತೋಮ್ಮೆ ದೃಢೀಕರಿಸಿಕೊಂಡು ಅಳತೆಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆಯನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಕೈಗೊಂಡು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಪರತ್ತುಗಳಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟು ಮುಂದಿನ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬಹುದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಡಲಾಗಿದೆ.

1. ಕಾಮಗಾರಿಯ ಏಟಿಂಬಾರು ಅಂಶ, ಅಳತೆ ಮತ್ತು ಪರಿಮಾಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಖಾತರಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು.
2. ಕಾಮಗಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಯಾವುದೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕಳಪೆ ಕೆಲಸ ಅಗಿಲ್ಲದಿರುವುದನ್ನು ಖಾತರಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು.

07) ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಫಲಿತಾಂಶದಲ್ಲಿನ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಗುಣಭರವಸೆಯ ವರದಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಅನುಷ್ಠಾನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಹಾಗೂ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಆಯುಕ್ತರವರ ಆದೇಶದ ಸಂಖ್ಯೆ: ಮು.ಆ/ಪಿಎಸ್‌ಆರ್(ಜಿ)/ 1646/2022-23, ದಿನಾಂಕ: 01.08.2022 ಹಾಗೂ ಸಂಖ್ಯೆ: ಮು.ಆ/ಪಿಎಸ್‌ಆರ್ (ಜಿ)/2383/2022-23, ದಿನಾಂಕ:-14.09.2022 ರಂತೆ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಮುಂದಿನ ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಕೋರಿ ಕಡತವನ್ನು ತಮ್ಮ ಅವಗಾಹನೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.

ಕಿರಿಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ಗುಣಭರವಸೆ)

08) ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ಗುಣಭರವಸೆ) ರವರಿಗೆ

ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು
ಗುಣಭರವಸೆ/ಗುಣನಿಯಂತ್ರಣ
ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

09) ಕಾಲಾವಕಾಶವಿದ್ದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೆಂದು

Bruhath Bengaluru Mahanagara Palike

QUALITY ASSURANCE/QUALITY CONTROL REPORT

Office of the Chief Engineer (Quality Assurance/Control) Annexure-05,
BBMP Head Office, Hudson circle Bengalore-001,
Ph.no:08022975541, E-mail ID:qualitycontrol.bbmp@gmail.com

QUALITY ASSURANCE/QUALITY CONTROL REPORT

CE/QA/PR/798/2023-24, DATE:15/11/23		
Name of Work	:	Providing and Installation of Decorative Tuskar street lights from Tirumala Daba to M.S.Palya Circle in ward no 03.
Job Code/ Est Amt	:	003-22-000030, EST AMT RS. 250.00 Lakhs Bill Amt Rs:- 24070495.43
Bill No.	:	1st and Final Bill
Type of Test Performed	:	Physical Inspection, Lux measurement as per BIS 10322:2012
Materials on which Tests Was Performed	:	1. Physical Inspection of Tusker Type Tubular Pole 2. Physical Inspection of 90 W and 150 Watts LED Street Lights 3. Physical Inspection of Timer
Officers present during inspection	:	1. Sri. Rajendra Naik EE– Ele Yelahanka 2. Sri Syed Jameel JE – Ele West Zone
Project Management Consultants	:	
Observations	:	**Field Inspection:** • The functioning of existing 90 Watts and 150 Watts LED Street Lights was verified. • The functioning of existing Timer's was verified. • The Installed 7.5 Mtrs Tubular Pole and Tusker Poles was physically verified. **Field test for lux measurement** ➢ Field test was conducted at Random Locations at M.S.Palya Main Road from Tirumala Daba to M.S.Palya Circle in ward no 03 Lux measurement was done using lux meter & lux level of 45 to 106 lux was recorded in the instrument. at 9.30 PM on 09-11-2023. ➢ The lux level was found to be in accordance with standards/specifications.

ಕಿರಿಯ ಅಭಿಯಂತರರು

ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು

003-22-000030

Test Locations	:	**Field Verification at random location:** 1. Location 1: Thirumala Dabha junction, M S Palya main Road LUX: 53. (Tuskar Pole and 150 W Street light). 2. Location 2 : Opposite to Green Pine, M S Palya main Road. LUX: 65. (Tuskar Pole and 150 W Street light). 3. Location 3 : Opposite to Royal Enfield, M S Palya main Road LUX: 57. (Tuskar Pole and 150 W Street light). 4. Location 4 : Opposite to Adhi Shakthi Chowdeshwari Temple, M S Palya main Road LUX: 57. (Tuskar Pole and 150 W Street light). 5. Location 5 : Opposite to Sumuk Square, M S Palya main Road. LUX: 61. (Tuskar Pole and 150 W Street light). 6. Location 6 : No 284 A, AMS Layout, Vidyaranyapura LUX: 45. (7.5 Mtrs Tubular Pole and 90 W Street light). 7. Location 7 : Saravana Nilaya, 1st Main, 3rd Cross, Thirumala Nagar. LUX: 70. (90 Watts Street lights) 8. Location 8 : Opposite to SR Glass and ply wood Thirumala Nagar, 1st Main, 4th Cross, (Timer) 9. Location 9 : GE/03/TC/01/14/MR/04/S, 1st Main, SFS 4TH phase Yelahanka New town LUX: 106. (90 Watts Street lights)

Table-02: Summary of Lux Measurement of Installation on Inspected site.

S No	LOCATIONS	LUX Measurement Recorded
1	Location 1	53
2	Location 2	65
3	Location 3	57
4	Location 4	57
5	Location 5	61
6	Location 6	45
7	Location 7	70
8	Location 9	106

Conclusion:

The file containing 1st and Final Bill has been submitted for the above work to QA department on 07-11-2023 requesting for spot inspection. Engineers of QA/QC division have visited the work spot on 09-11-2023.

During the inspection, it was observed that the items provided in estimate have been executed by the contractor. The lux measurement was done using lux meter & lux level of 45 to 106 lux was recorded in the instrument. The lux level was found to be in accordance with standards/specifications.

Physical verifications of installed 7.5 Mtrs Tubular Pole, Tuskar Poles and 90 Watts and 150 Watts LED Street Lights and Timer was verified at above locations and found work satisfactory as per BBMP Standards.

All materials or work not conforming to the requirements of the specifications shall be considered unacceptable and rejected. The unacceptable materials or works that are rejected shall be immediately removed unless the defects are corrected and approved by the engineer in-charge of work.

The concerned Engineer in charge of the work shall follow the direction issued by Chief Commissioner Letter number dated 01.08.2022 and 14.09.2022 and take necessary action as appropriate in accordance with the law.

Note:-

This report by QA/QC is pertaining to the work carried out in 1st and Final Bill only. Therefore, further QA/QC reports shall be obtained for the items of work carried out in future Running Account bill / Final bill

Safety precautions shall be taken at work spot to prevent any mishap, injuries or loss of life to general public and construction workers according to guidelines laid down in code of practices.

Location 1: Thirumala Dhaba junction, M S Palya main Road

GPS Map Camera
Bengaluru, Karnataka, India
201, Major Sandeep Unnikrishnan Rd, Attur Layout, Vignana Kendra, Bengaluru, Karnataka 560064, India
Lat 13.097304°
Long 77.562685°
09/11/23 09:27 PM GMT +05:30
Google

GPS Map Camera
Bengaluru, Karnataka, India
201, Major Sandeep Unnikrishnan Rd, Attur Layout, Vignana Kendra, Bengaluru, Karnataka 560064, India
Lat 13.097314°
Long 77.562686°
09/11/23 09:28 PM GMT +05:30
Google

ಕಿರಿಯ ಅಭಿಯಂತರರು
ಉದ್ಯಾನವನಗಳು ಮತ್ತು ವಿಭಾಗ

ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು
ಗುಣಮಟ್ಟ ನಿಯಂತ್ರಣ
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

Providing and Installation of Decorative Tuskar street lights from Tirumala Daba to M.S.Palya Circle in ward no 03.

Location 2 : Opposite to Green Pine, M S Palya main Road

ಕಿರಿಯ ಅಭಿಯಂತರರು

ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು

Providing and Installation of Decorative Tuskar street lights from Tirumala Daba to M.S.Palya Circle in ward no 03.

Location 3 : Opposite to Royal Enfield, M S Palya main Road

ಕಿರಿಯ ಅಭಿಯಂತರರು
ಗುಣಮಟ್ಟ/ಗುಣನಿಯಂತ್ರಣ ವಿಭಾಗ

ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು
ಗುಣಮಟ್ಟ/ಗುಣನಿಯಂತ್ರಣ

Providing and Installation of Decorative Tuskar street lights from Tirumala Daba to M.S.Palya Circle in ward no 03.

Location 4 : Opposite to Adhi Shakthi Chowdeshwari Temple, M S Palya main Road

ವಿಶೇಷ ಅಧಿಕಾರಿಯವರು

ಮುಖ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿಯವರು

Providing and Installation of Decorative Tuskar street lights from Tirumala Daba to M.S.Palya Circle in ward no 03.

Location 5 : Opposite to Sumuk Square, M S Palya main Road.

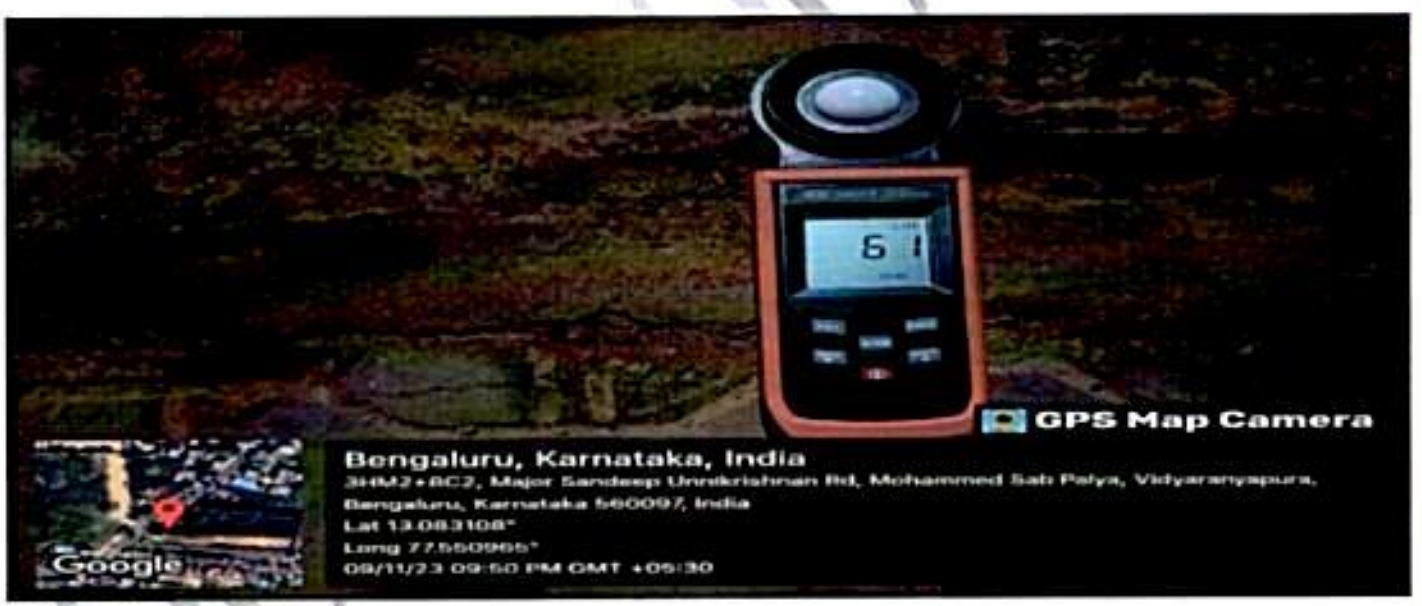

Providing and Installation of Decorative Tuskar street lights from Tirumala Daba to M.S.Palya Circle in ward no 03.

Location 6 : No 284 A, AMS Layout, Vidyaranyapura

GPS Map Camera
Bengaluru, Karnataka, India
354, 3rd Cross Rd, AMS Layout, Vidyaranyapura, Bengaluru, Karnataka 560097, India
Lat 13.086379°
Long 77.558561°
09/11/23 09:57 PM GMT +05:30
Google

ಕಿರಿಯ ಅಭಿಯಂತರರು
ಗುಣಮಟ್ಟ/ಗುಣನಿಯಂತ್ರಣ ವಿಭಾಗ
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು
ಗುಣಮಟ್ಟ/ಗುಣನಿಯಂತ್ರಣ
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

Providing and Installation of Decorative Tuskar street lights from Tirumala Daba to M.S.Palya Circle in ward no 03.

Location 7 : Saravana Nilaya, 1st Main, 3rd Cross, Thirumala Nagar.

GPS Map Camera
Bengaluru, Karnataka, India
10, 1st A Cross Rd, Kavari Layout, Attur Layout, Yelahanka New Town, Bengaluru, Karnataka 560064, India
Lat 13.097896°
Long 77.561947°
09/11/23 10:04 PM GMT +05:30
Google

70
GPS Map Camera
Bengaluru, Karnataka, India
379 Thirumalappa nagar attur Rd 2nd Stage, Akshaya Nagar, Attur Layout, Yelahanka New Town, Bengaluru, Karnataka 560064, India
Lat 13.097976°
Long 77.561958°
09/11/23 10:04 PM GMT +05:30
Google

ಮುಖ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿಯವರು
ಗುಣಮಟ್ಟದ/ಗುಣನಿಯಂತ್ರಣ
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

Providing and Installation of Decorative Tuskar street lights from Tirumala Daba to M.S.Palya Circle in ward no 03.

Location 8 : Opposite to S R Glass and ply wood Thirumala Nagar, 1st Main, 4th Cross,

GPS Map Camera
Bengaluru, Karnataka, India
56,57 & 58, A-BLOCK, thirumala nagarAttur Layout, A, 6th Cross St, Attur Layout,
Yelahanka New Town, Bengaluru, Karnataka 560064, India
Lat 13.098032°
Long 77.561616°
09/11/23 10:06 PM GMT +05:30
Google

GPS Map Camera
Bengaluru, Karnataka, India
56,57 & 58, A-BLOCK, thirumala nagarAttur Layout, A, 6th Cross St, Attur Layout,
Yelahanka New Town, Bengaluru, Karnataka 560064, India
Lat 13.098018°
Long 77.561631°
09/11/23 10:06 PM GMT +05:30
Google

ಕಿರಿಯ ಅಭಿಯಂತರರು
ಗುಣಮಟ್ಟ/ಜವಾಬ್ದಾರಿ ವಿಭಾಗ
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು
ಗುಣಮಟ್ಟ/ಜವಾಬ್ದಾರಿ/ಗುಣನಿಯಂತ್ರಣ
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

Providing and Installation of Decorative Tuskar street lights from Tirumala Daba to M.S.Palya Circle in ward no 03.

Location 9 : GE/03/TC/01/14/MR/04/S, 1st Main, SFS 4TH phase Yelahanka New town

ಕಿರಿಯ ಅಭಿಯಂತರರು

ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು
ಗುಣಮಟ್ಟ ನಿಯಂತ್ರಣ
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

Providing and Installation of Decorative Tuskar street lights from Tirumala Daba to M.S.Palya Circle in ward no 03.
